


深見小学校校舎（建築）工事写真・内訳書

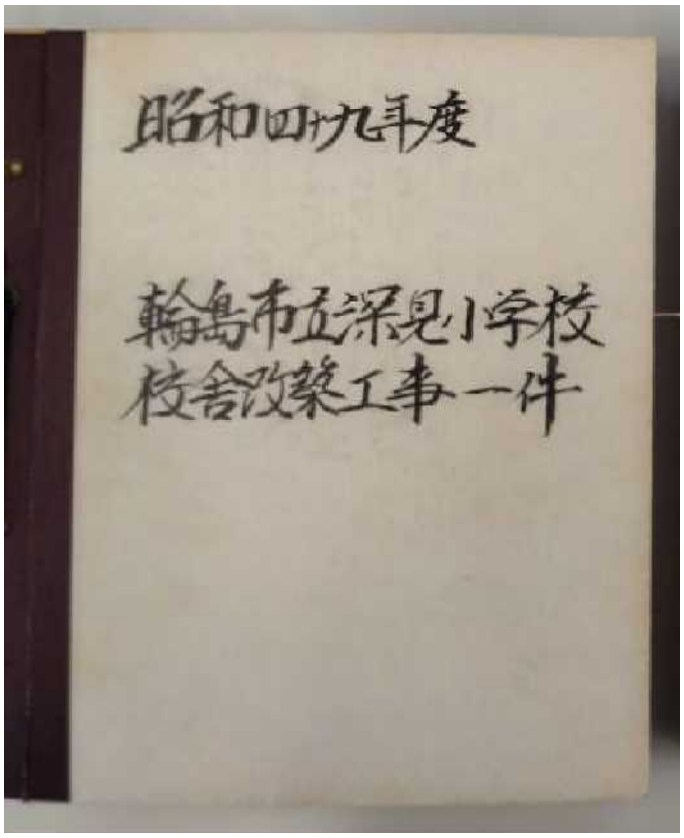



深見小学校校舎（設備）内訳書

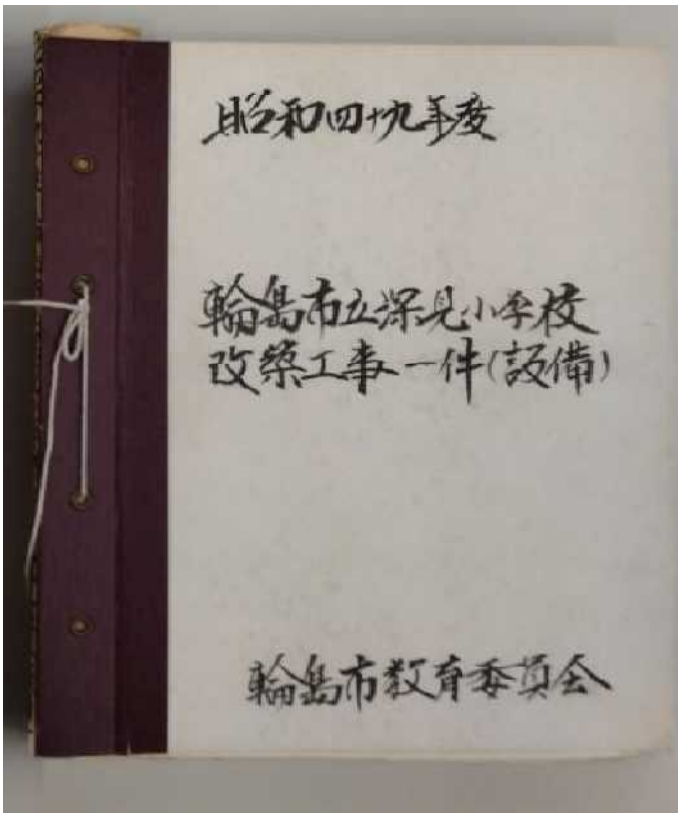

# 深見小学校確認申請書



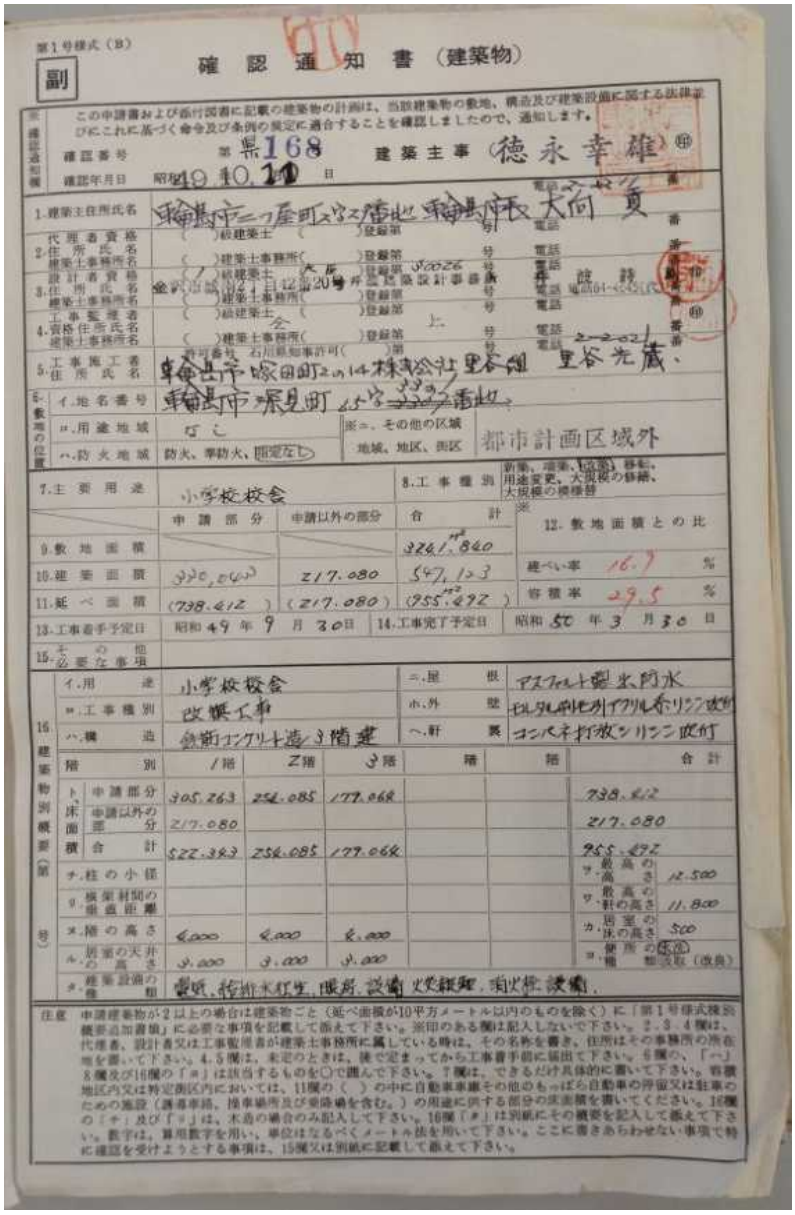第1号様式（B）

副

確認通知書（建築物）

この申請書および添付図書に記載の建築物の計画は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを確認しましたので、通知します。

確認番号　第県168号　建築主事（徳永幸雄）印

確認年月日　昭和49年10月11日

1.建築主住所氏名　輪島市二ツ屋町ス1号5番地　大向貢

2.代理者資格 住所 氏名 建築士事務所名

3.設計者資格 住所 氏名 建築士事務所名

4.工事監理者資格 住所 氏名 建築士事務所名

5.工事施工者 住所 氏名　輪島市塚田町2の14 株式会社 里谷組 里谷光蔵

6.敷地の位置 イ.地名番号　輪島市深見町ス1号5番地

ロ.用途地域　なし　※ニ.その他の区域 地域、地区、街区　都市計画区域外

ハ.防火地域　防火、準防火、指定なし

7.主要用途　小学校校舎　8.工事種別　新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替

| | 申請部分 | 申請以外の部分 | 合計 | 12.敷地面積との比 |
|---|---|---|---|---|
| 9.敷地面積 | | | 3261.840㎡ | |
| 10.建築面積 | 330.040 | 217.080 | 547.123 | 建ぺい率 16.7 % |
| 11.延べ面積 | (738.412) | (217.080) | (755.492) | 容積率 23.5 % |

13.工事着手予定日　昭和49年9月30日　14.工事完了予定日　昭和50年3月30日

15.その他必要な事項

16.建築物別概要（第　号）

イ.用途　小学校校舎　ニ.屋根　アスファルト製水切水
ロ.工事種別　改築工事　ホ.外壁　モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付
ハ.構造　鉄筋コンクリート造3階建　ヘ.軒裏　コンパネ打放シリシン吹付

| 階別 | 1階 | 2階 | 3階 | 階 | 階 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ト.床面積 申請部分 | 305.263 | 256.085 | 177.068 | | | 738.412 |
| 申請以外の部分 | 217.080 | | | | | 217.080 |
| 合計 | 522.343 | 256.085 | 177.068 | | | 955.492 |
| チ.柱の小径 | | | | | | リ.最高の高さ 12.500 |
| ヌ.横架材間の垂直距離 | | | | | | ヲ.最高の軒の高さ 11.800 |
| ヲ.階の高さ | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | カ.居室の床の高さ 500 |
| カ.居室の天井の高さ | 3.200 | 3.000 | 3.000 | | | ヨ.便所の(水洗)(汲取)(改良) |

タ.建築設備の種類　暖房、給排水衛生、電灯、設備 火災報知、消火栓 設備.

注意　申請建築物が2以上の場合は建築物ごと（延べ面積が10平方メートル以内のものを除く）に「第1号様式別紙（建築物追加書類）」に必要な事項を記載して添えて下さい。※印のある欄は記入しないで下さい。2、3、4欄は、代理者、設計者又は工事監理者が建築士事務所に属している時は、その名称を書き、住所はその事務所の所在地を書いて下さい。4、5欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届出て下さい。6欄の、「ハ」、8欄及び16欄の「ヘ」は該当するものを○で囲んで下さい。7欄は、できるだけ具体的に書いて下さい。容積地区内又は特定街区内においては、11欄の（　）の中に自動車車庫その他のもっぱら自動車の停留又は駐車のための施設（運転車路、操車場所及び車路を含む。）の用途に供する部分の床面積を書いてください。16欄の「チ」及び「ヌ」は、木造の場合のみ記入して下さい。16欄「タ」は別紙にその概要を記入して添えて下さい。数字は、算用数字を用い、単位はなるべくメートル法を用いて下さい。ここに書きあらわせない事項で特に確認を受けようとする事項は、15欄又は別紙に記載して添えて下さい。

深見小学校屋内運動場設計図

